

资产评估明细表

委托人：五莲县矿产资源管理办公室

评估基准日：2024年12月28日

序号	名称	面积 (m²)	外运方量 (m³)	单价/m³	金额	资产位置	备注
1	石方	7927.1	33965.90	11.00	373624.90	中至镇薄板台村东，汪黄路西。	按图所示数量进行开挖、装运，并环保、道路清洁等相关费用。
合计					373624.90		

薄板台村设施农业用地项目建设工程量计算说明

五莲县矿产资源管理办公室委托我公司为薄板台村设施农业用地项目建设土石料计算，我公司于2024年12月27日进行了开挖前原始地貌测量，经与建设单位沟通，在红线内范围，计算标高取已有建筑物地坪高程174.90m为起算点，计算如下：


1、地块开挖面积：7927.1m²，挖方量：47965.9m³，护坡及基础利用方量：14000m³。

注：

实际外运方量=47965.9m³-14000m³=33965.9m³



三角网法土石方计算

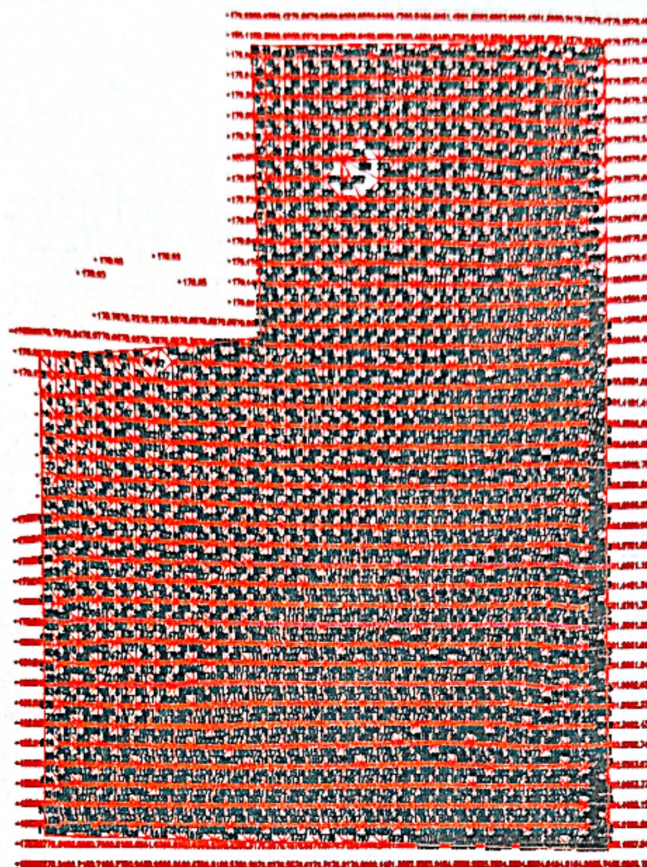

平场面积 = 7927.1 平方米

最小高程 = 177.801 米

最大高程 = 190.187 米

平场标高 = 174.900 米

挖方量 = 47965.9 立方米

填方量 = 0.0 立方米



算日期： 2024年12月28日
